

72003879

CONS: 2060

FECHA: 30-09-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 8646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
		00		CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB204004	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 6-0-2100-0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO:		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO. VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105028 ; PA-17, 5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (INTEGRADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1		Kit de Mantenimiento Preventivo	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003879

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: 4B204604

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

REALIZÓ

v/x MEDICIÓN

1.

REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:

ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA

CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES

TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)

FILTRO DE BACTERIAS

SET DE FILTROS DE REPUESTO

*PULSIOXÍMETRO

INSTITUTO MEXICANO *SENSOR DE CAPNOGRAFÍA

DEL SEGURO *ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA

*BRAZO

ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO

*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA

BASE RODABLE

2.

CALIBRACIONES:

ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN

CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN

CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO

CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS

CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS

ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO

CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO

CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO

CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZACIÓN

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

3.

VERIFICACIÓN DE:

TEST DE VÁLVULAS

H G R. No 1

TEST DE ALARMAS

FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO

TEST DE SALIDA A USUARIO

REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL

REVISIÓN DE BATERÍAS

TEST USB

mAh

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

4.	SELFTEST	/	
	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS	/	
	SENSOR DE CO2	/	
	SENSOR DE SPO2	/	
5.	ALERTA ACÚSTICA	/	
	TEST DE VENTILACIÓN	/	
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	503 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	497 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.1 rpm
7.	TEST DE ALARMAS	/	
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISION DE BATERIA	/	
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN	/	
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	125 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓ 0.34 Ω
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 mA	CORRIENTE RESIDUAL				
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
		REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.					X
		LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.					X
		VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.					X
		ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR					X
		VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.					X
		VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES					X
		VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)					X
		VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)					X
		VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL					X
16.		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.					X

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

OBSERVACIONES:

Rafael SC
Ing. Rafael Sanchez Cordova

EJP. Cecylia Ines
Orduño López Mat. 99022217

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

30-09-25 REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMEDICA
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

SERIE:

MB204004


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ORDEN DE SERVICIO: 72003879

CONS:

2060

ANTES 2

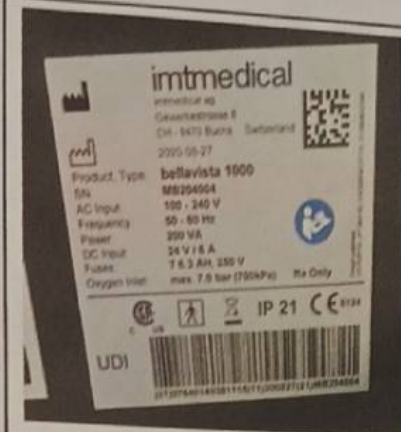

DURANTE 1




INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECORDADO
30 SEP 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1




DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

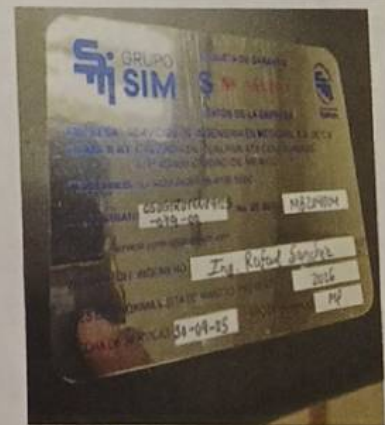

SELLO UNIDAD MEDICA



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
MSS Mar 14/2025
